

Projet SPEED

Suivi du Parcours Étudiant, Engagement et Développement

ENICarthage | 2025-2026

Roudeyna Bouznif · Wissal Azzouz · Malek Ayed



Suivi Académique



Bien-être




IA Prédictive



Sécurité

Sommaire



Structure de la présentation

- 01** Contexte & Problématique
- 02** Résumé & Objectifs
- 03** WBS & Product Backlog
- 04** Budget Estimatif
- 05** Planification – GANTT & PERT

- 06** Parties Prenantes
- 07** Gestion des Risques
- 08** Plan de Communication
- 09** Conclusion

01

Contexte & Problématique

La Problématique à l'ENICarthage

Un suivi étudiant fragmenté et inefficace



Dispersion des données

Fichiers Excel, emails, échanges informels sans centralisation



Détection tardive

Difficultés académiques détectées trop tard pour intervenir



Coordination insuffisante

Manque de lien entre enseignants, psychologues et scolarité



Absence de traçabilité

Actions d'accompagnement non documentées ni suivies

02

Résumé & Objectifs

Résumé Exécutif

Qu'est-ce que SPEED ?



Suivi Académique

Notes & absences



Bien-être

Mood tracker & journal

SPEED

ENICarthage



IA Prédictive

Détection des risques



Communication

Messagerie interne

Objectifs SMART du Projet

7 livrables clés sur 7 mois

Plateforme web + Auth sécurisée	6 mois
Suivi académique (notes, absences)	4 mois
Mood tracker + Journal de bord	5 mois
Rendez-vous & Messagerie interne	5 mois

Analyse prédictive IA	6 mois
Sécurité & Gestion des rôles	4 mois
Déploiement & Formation	7 mois


★ Taux de satisfaction cible : $\geq 85\%$ | Temps de réponse : < 2 sec | Erreurs critiques : $< 3\%$

03

WBS & Product Backlog

Work Breakdown Structure (WBS)

Décomposition hiérarchique du projet

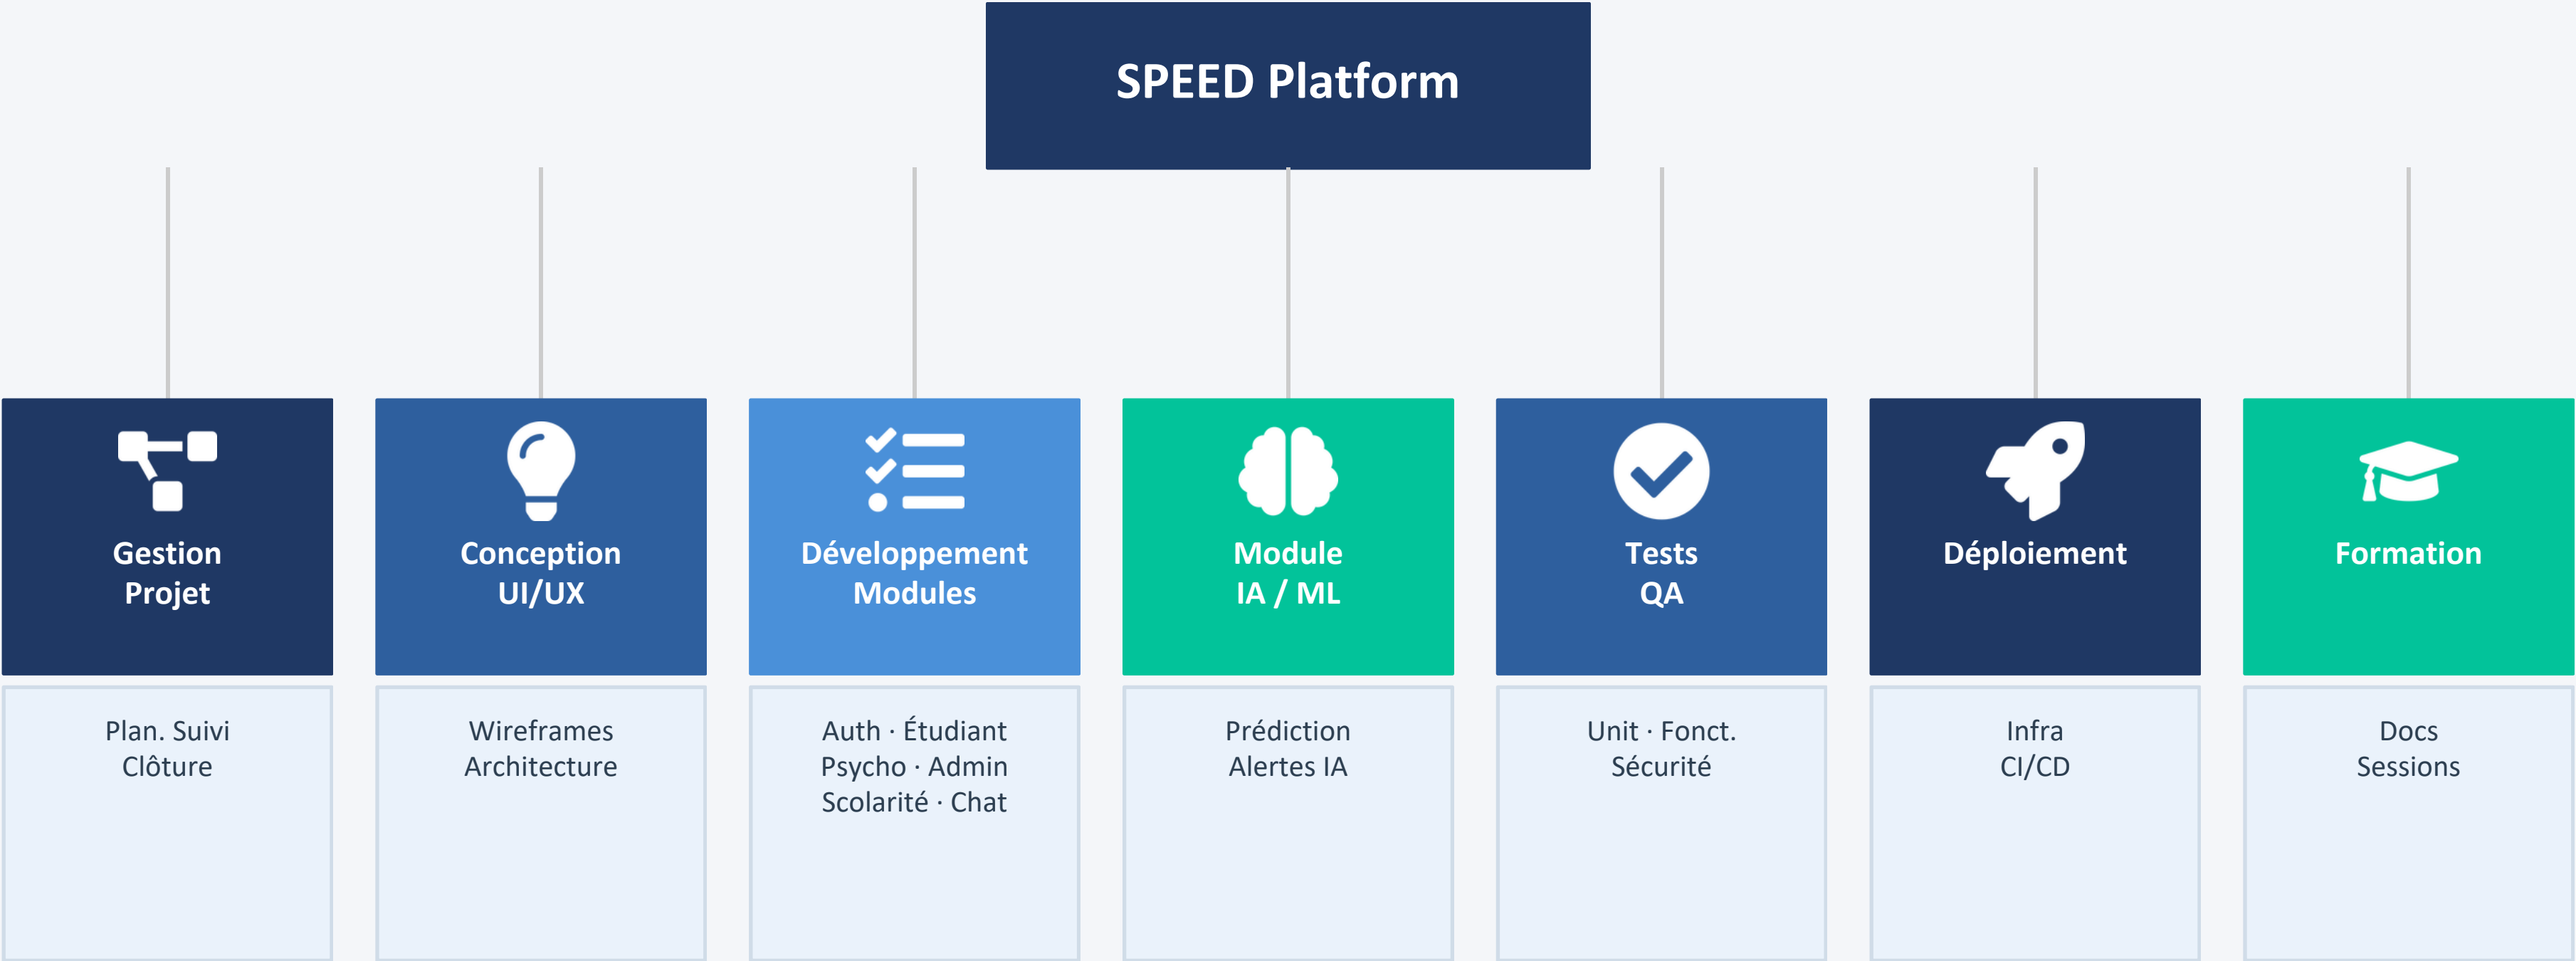

Product Backlog – User Stories Clés



17 User Stories organisées en 6 sprints

ID	User Story	Priorité	Sprint
US-01	Se connecter de façon sécurisée (tous rôles)	Critique	S1
US-03	Consulter notes et absences (étudiant)	Haute	S2
US-04	Renseigner l'humeur quotidienne (mood tracker)	Haute	S2
US-06	Prendre un rendez-vous avec le psychologue	Haute	S3
US-08	Voir les alertes d'étudiants en difficulté (psy.)	Critique	S3
US-11	Envoyer/recevoir des messages internes	Haute	S4
US-12	Détecter les risques de décrochage via l'IA	Critique	S5
US-16	Signaler une difficulté (confidentialité choisie)	Haute	S6

+ 9 autres User Stories (US-02, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 17) couvrant admin, scolarité, documents, rapports et notifications.


04

Budget Estimatif

Budget Estimatif – En Dinars Tunisiens (TND)



Simulation professionnelle – Tarifs marché tunisien

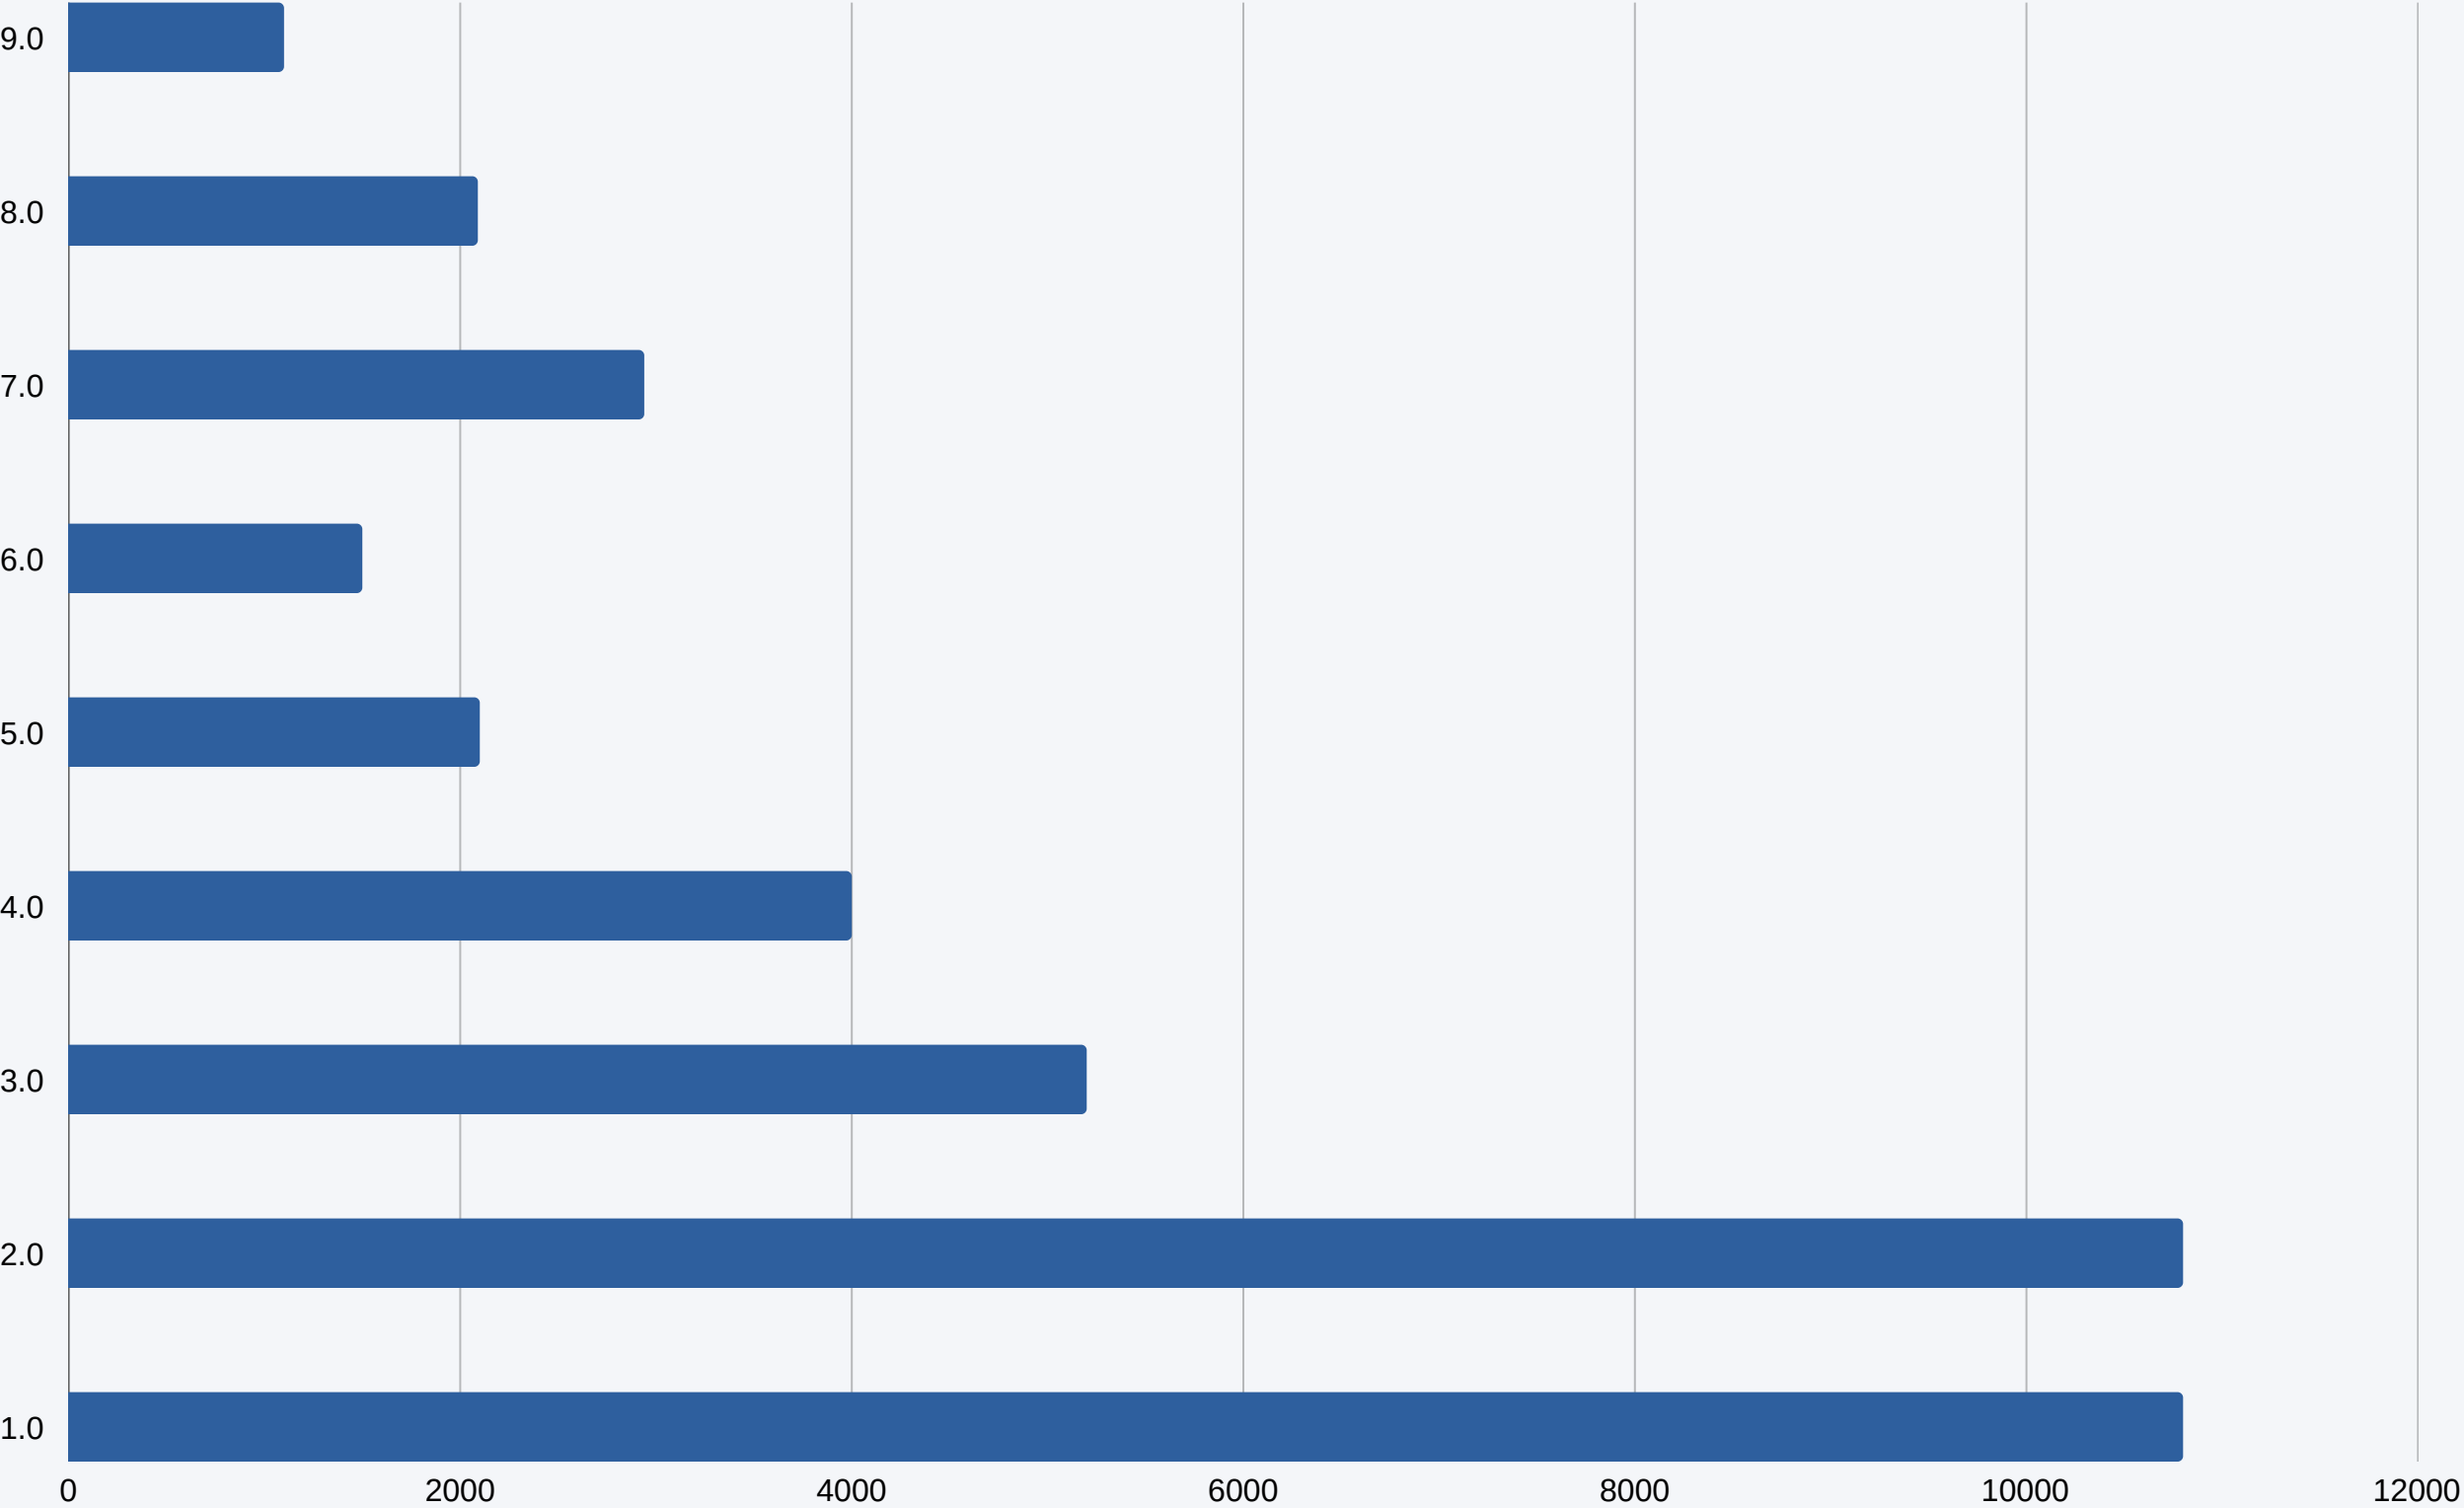

39 530

TND Main-d'œuvre

1 000

TND Coûts matériels

4 053

TND Contingence (10%)

≈ 44 583 TND

TOTAL


05

Planification – GANTT & PERT

Diagramme de GANTT – Vision Globale



26 semaines · 7 phases · 7 jalons clés

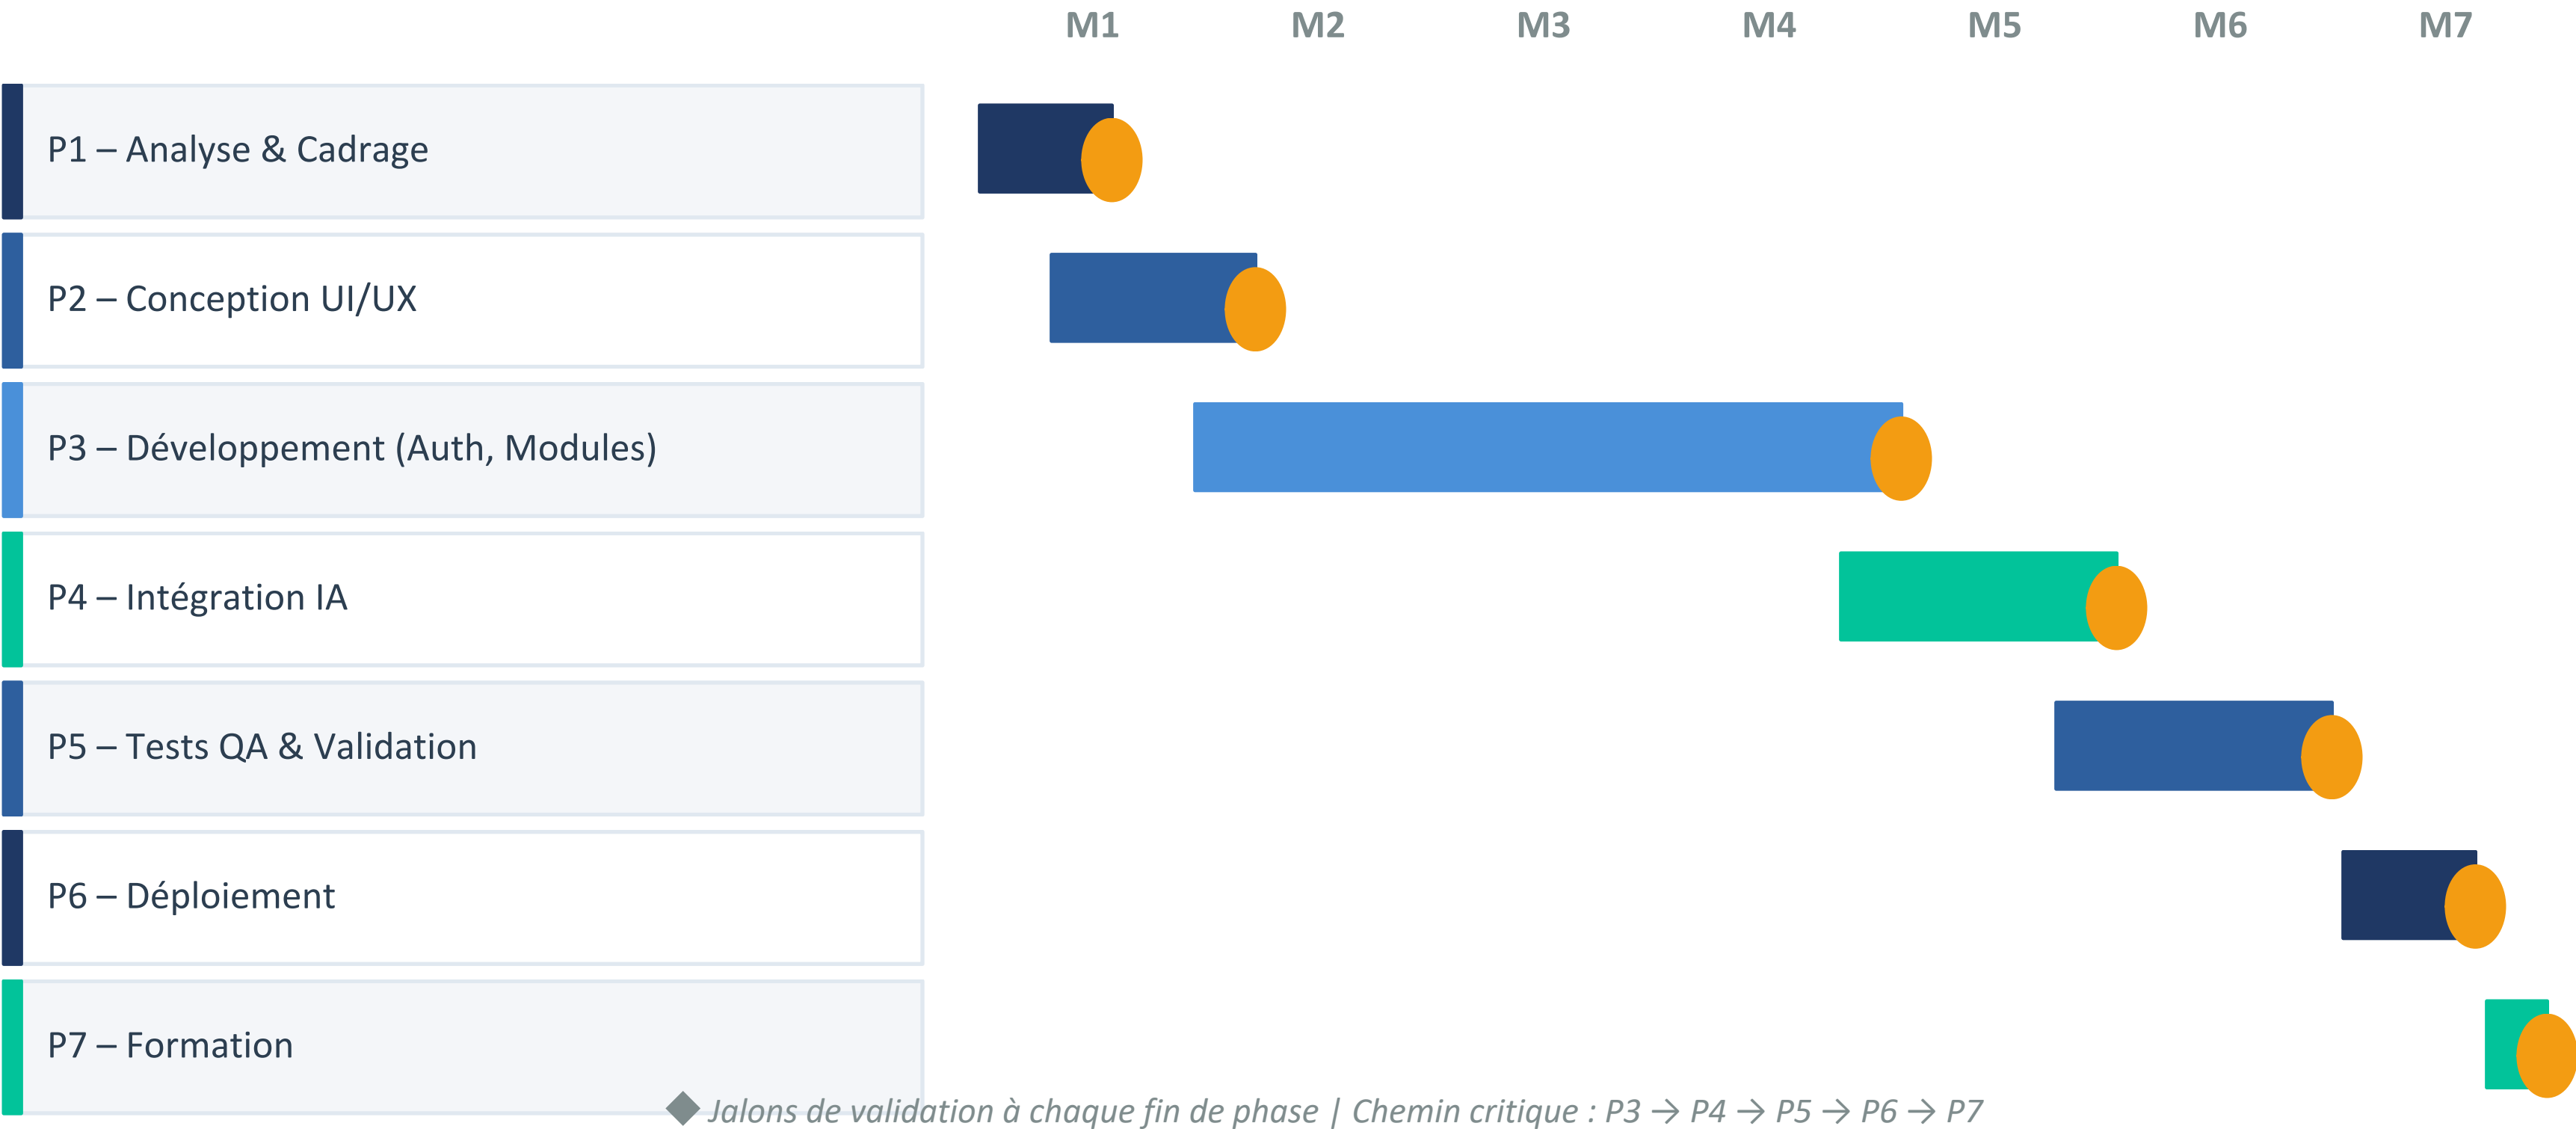


◆ Jalons de validation à chaque fin de phase | Chemin critique : P3 → P4 → P5 → P6 → P7

Réseau PERT & Chemin Critique



Durée minimale du projet : 25 semaines

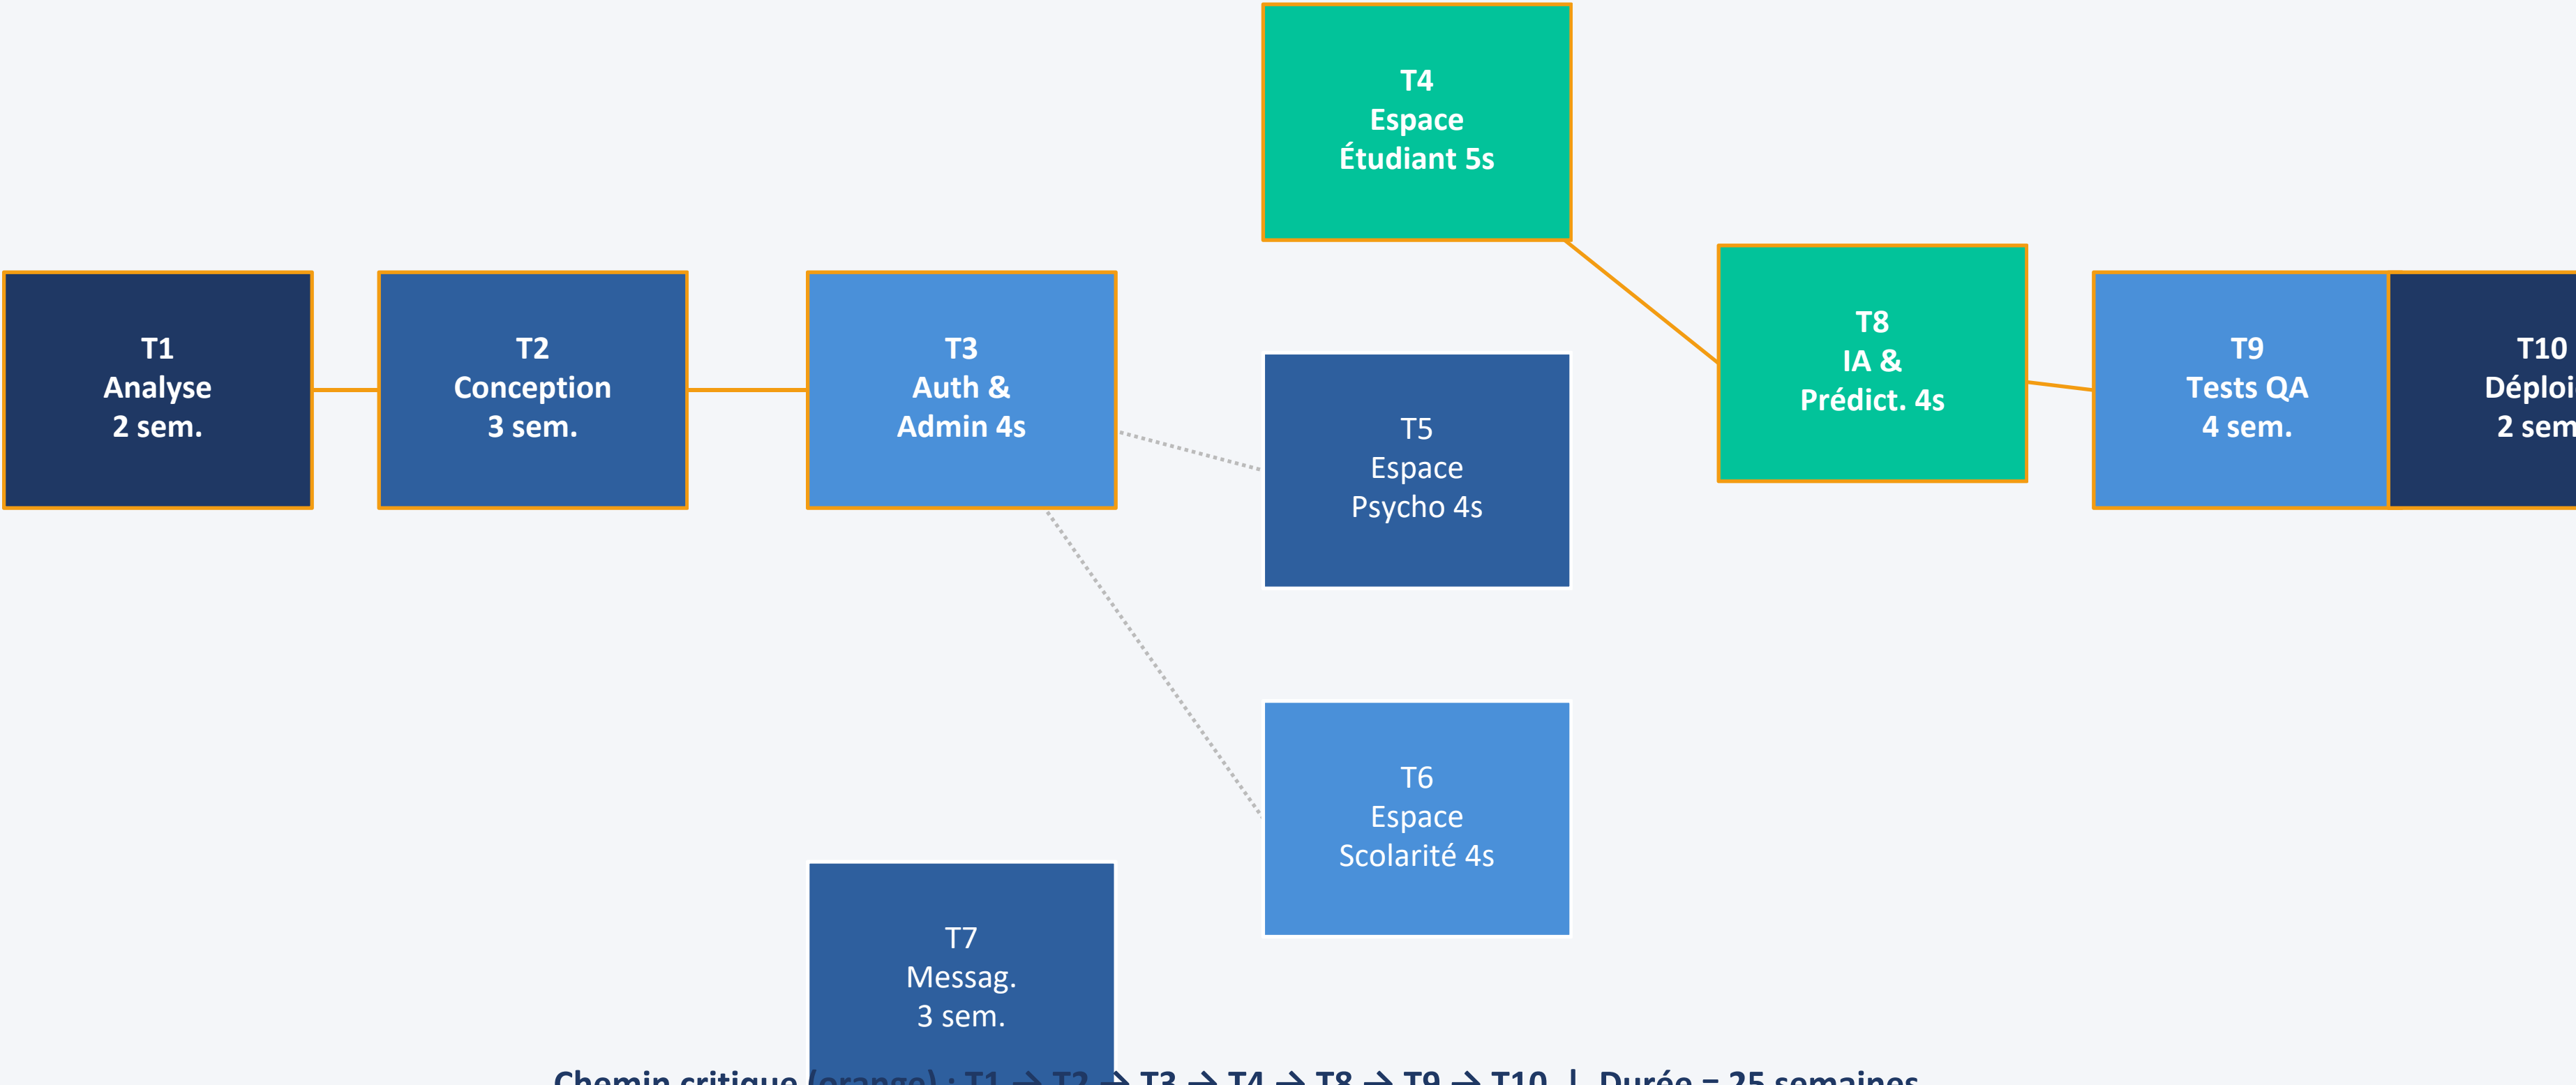


Chemin critique (orange) : T1 → T2 → T3 → T4 → T8 → T9 → T10 | Durée = 25 semaines

06

Parties Prenantes

Matrice Pouvoir / Intérêt

Analyse & stratégies de gestion des parties prenantes

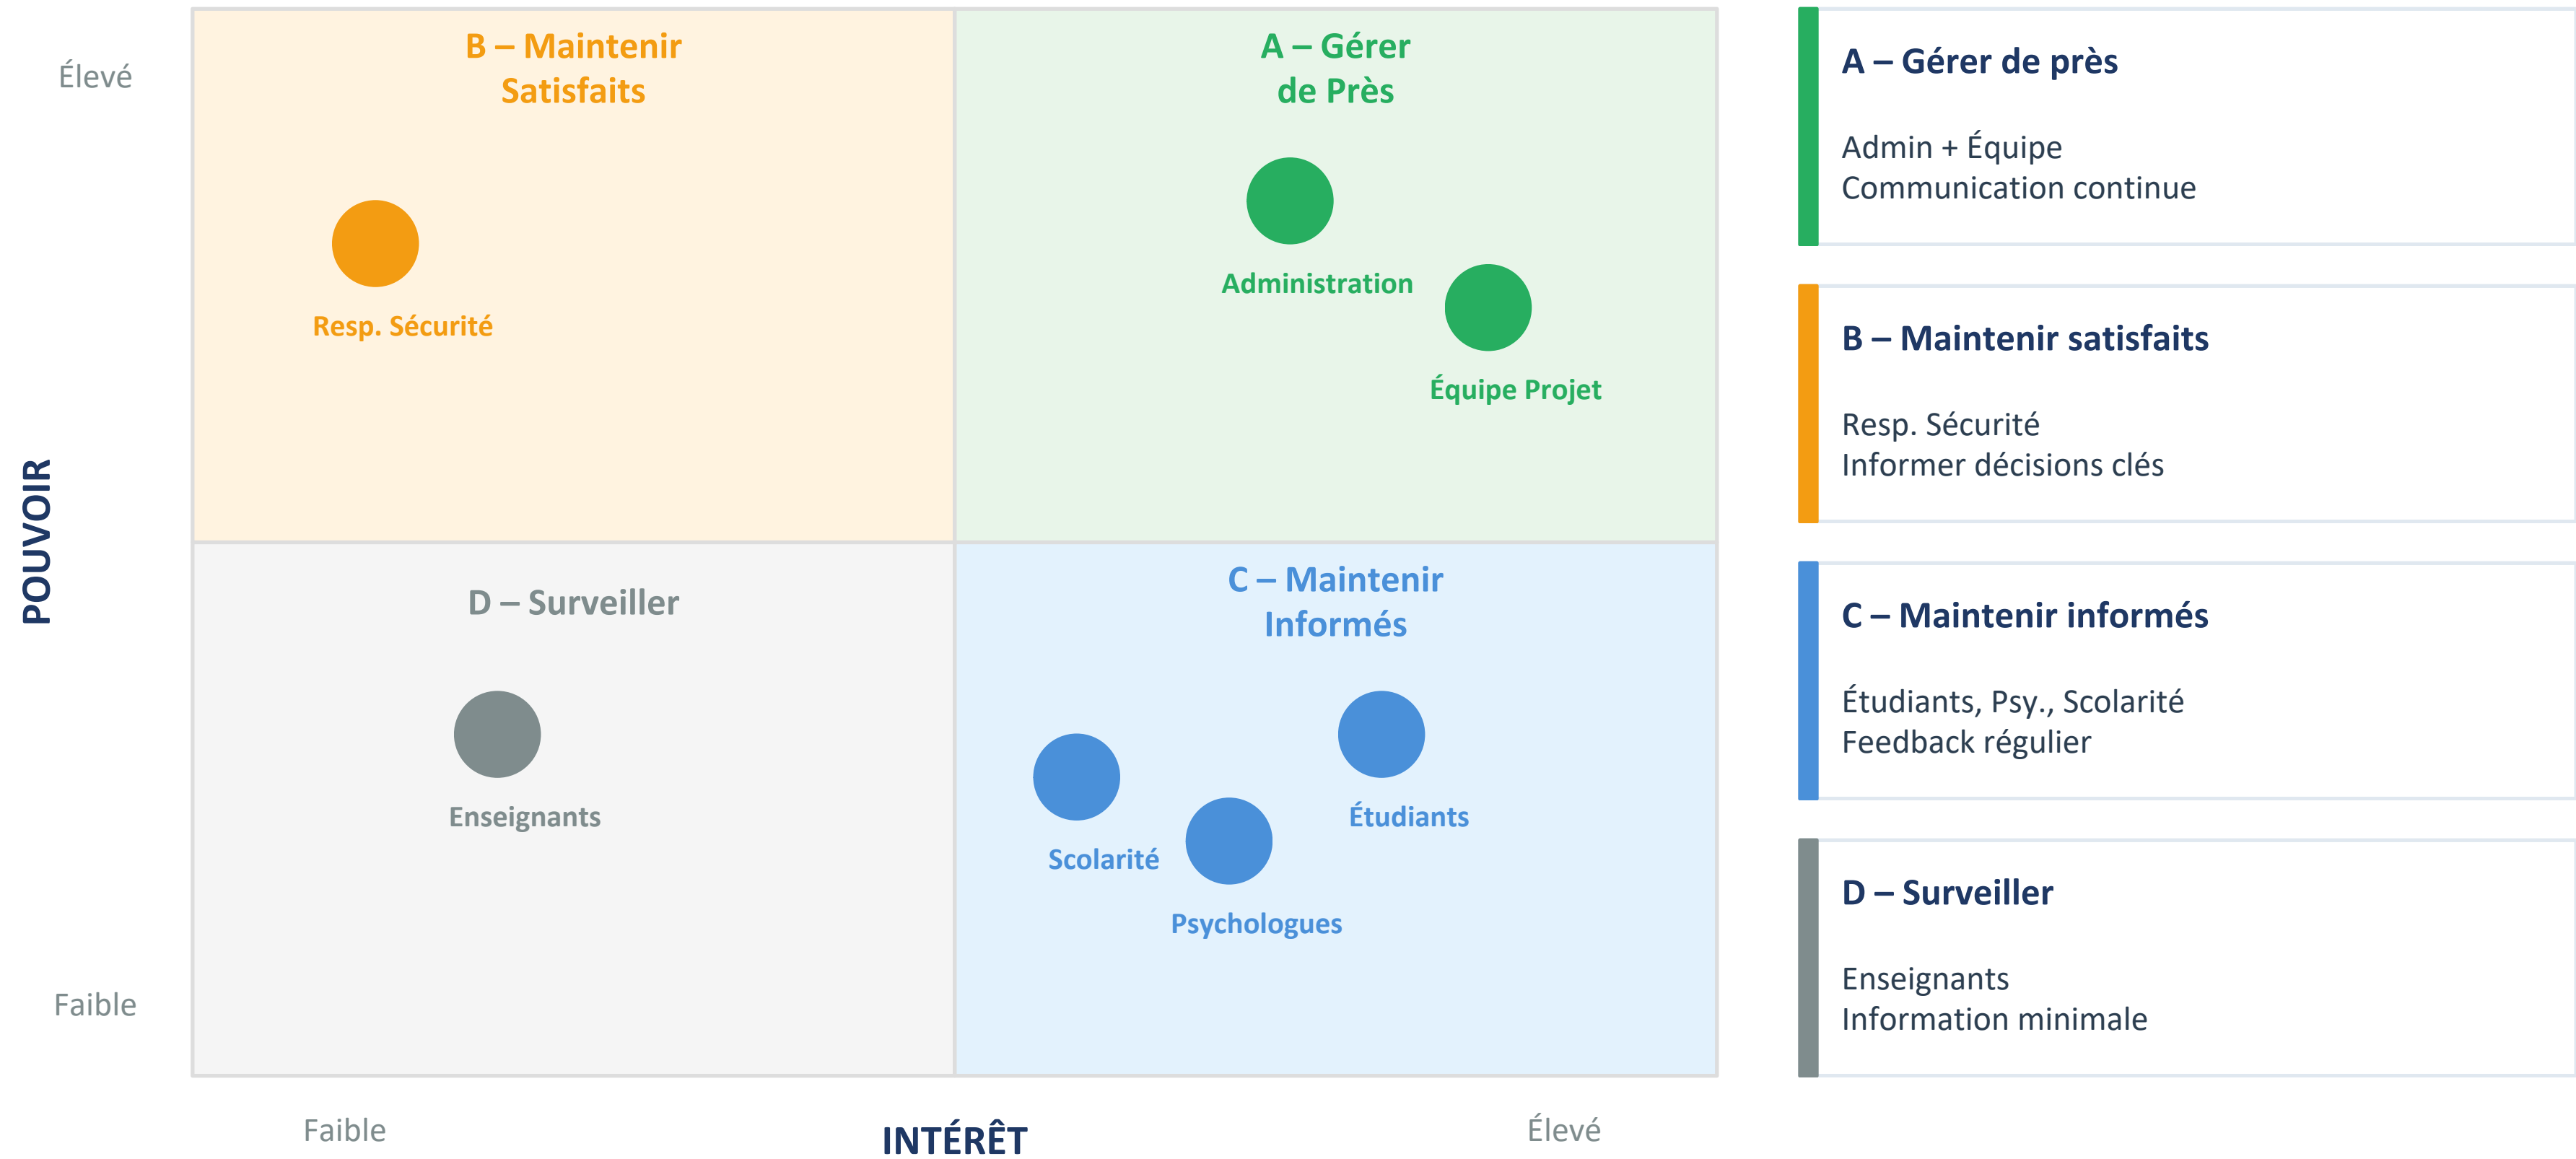


07

Gestion des Risques

Matrice des Risques

Cartographie Probabilité × Impact

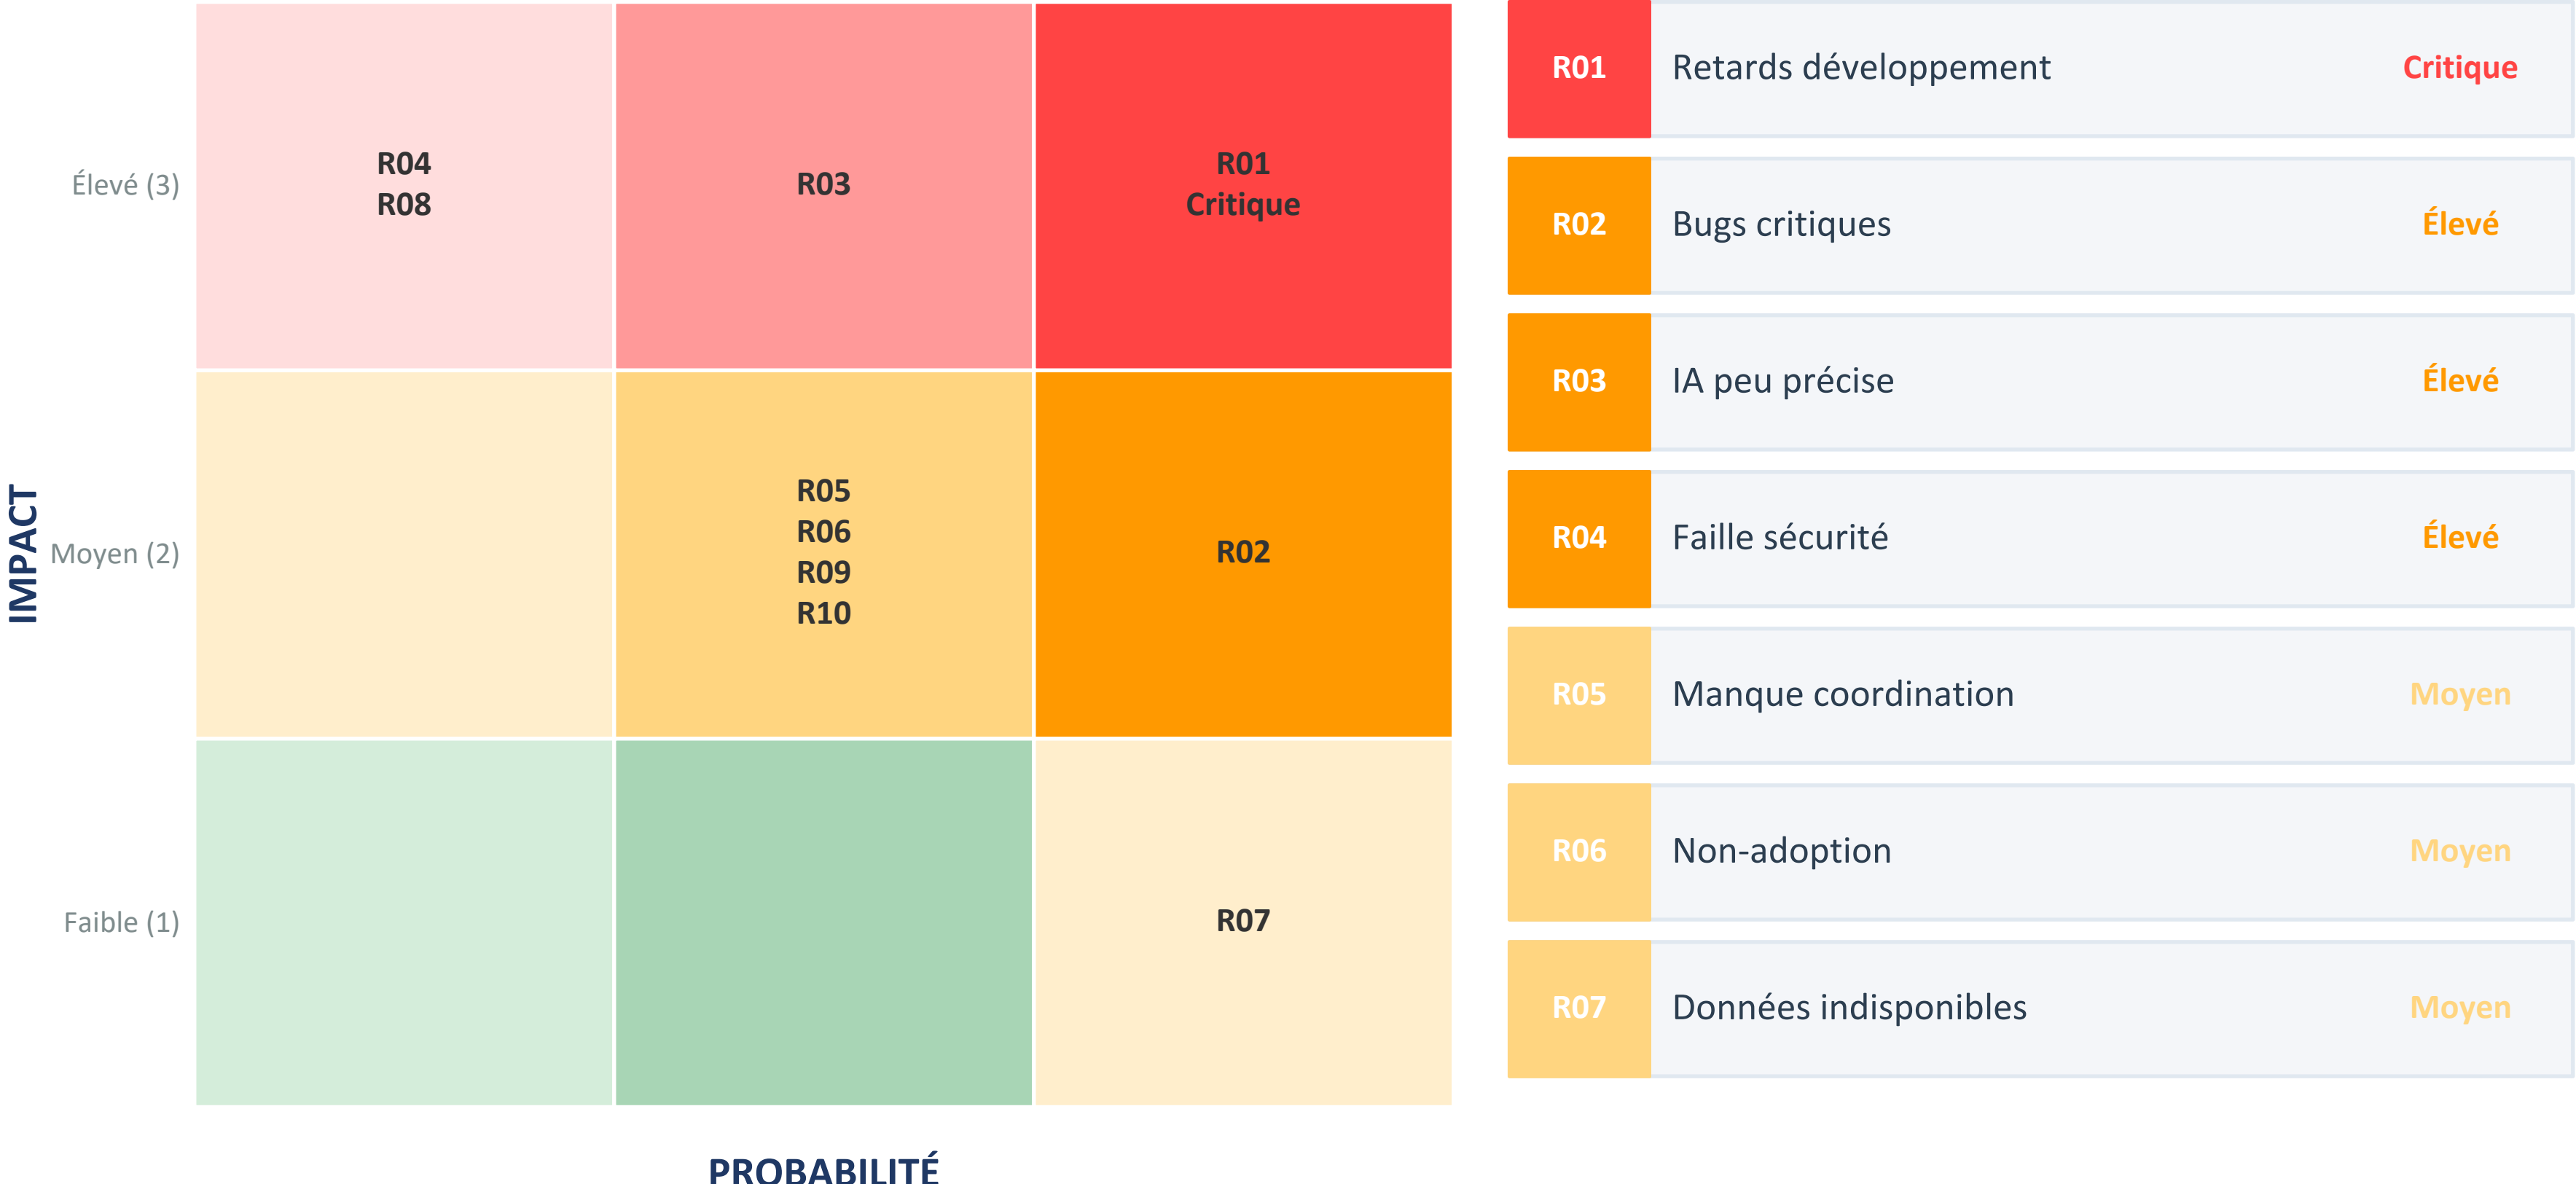

Stratégies de Mitigation des Risques

Actions concrètes pour chaque risque identifié

R01	Retards Réduction Sprints strictes + suivi hebdo + 10% tampon délais	R05	Coordination Réduction Stand-up quotidien + Git + Trello/Jira
R02	Bugs Réduction TDD + revues de code + pipeline CI/CD automatisé	R06	Non-adoption Réduction UX intuitive + utilisateurs impliqués dès la conception
R03	IA imprécise Réduction Itérations modèles + données synthétiques + simplification	R09	Scope creep Évitement Processus formel changements + gel périmètre après S5
R04	Sécurité Évitement HTTPS + JWT + chiffrement BDD + audit pré-déploiement		

08

Plan de Communication

Plan de Communication



Canaux, fréquences et responsables

Communication	Destinataires	Fréquence	Canal
Stand-up Meeting	Équipe Projet	Quotidien	Discord/Teams
Rapport d'avancement	Sponsor / Admin	Hebdo	Email + Document
Revue de Sprint	Équipe + Sponsor	Bi-mensuel	Réunion + Vidéo
Validation de jalon	Toutes parties	Par jalon	Réunion formelle
Test / Démo utilisateurs	Étudiants, Psy., Scolarité	Mensuel	Atelier présentiel
Audit sécurité	Resp. Sécurité SI	Par livraison	Rapport écrit
Enquête satisfaction	Tous utilisateurs	Fin phase test	Google Forms
Outils : Discord • GitHub • Email ENICarthage • Figma • Trello • Google Forms • Réunions			

KPIs & Critères de Succès



Mesurer la réussite du projet SPEED

100% Fonctionnalités livrées	≤ 7 mois Durée du projet	< 3% Erreurs critiques (QA)	≥ 80% Étudiants actifs
≥ 85% Taux de satisfaction	0 Faillles sécurité critiques	< 2s Temps de réponse	44 583 Budget total estimé (TND)

Architecture Fonctionnelle – Espaces Utilisateurs

4 espaces dédiés + fonctionnalités communes

 **Espace Étudiant**

- Profil & Mood Tracker
- Journal de bord
- Rendez-vous
- Suivi académique
- Signalement

 **Espace Sclarité**


- Dossiers administratifs
- Validation documents
- Gestion absences
- Rapports & IA

 **Espace Psychologue**

- Agenda & planning
- Fiches confidentielles
- Alertes critiques
- Messagerie sécurisée

 **Espace Administrateur**

- Gestion utilisateurs
- Sécurité & audit
- Gestion psychologues

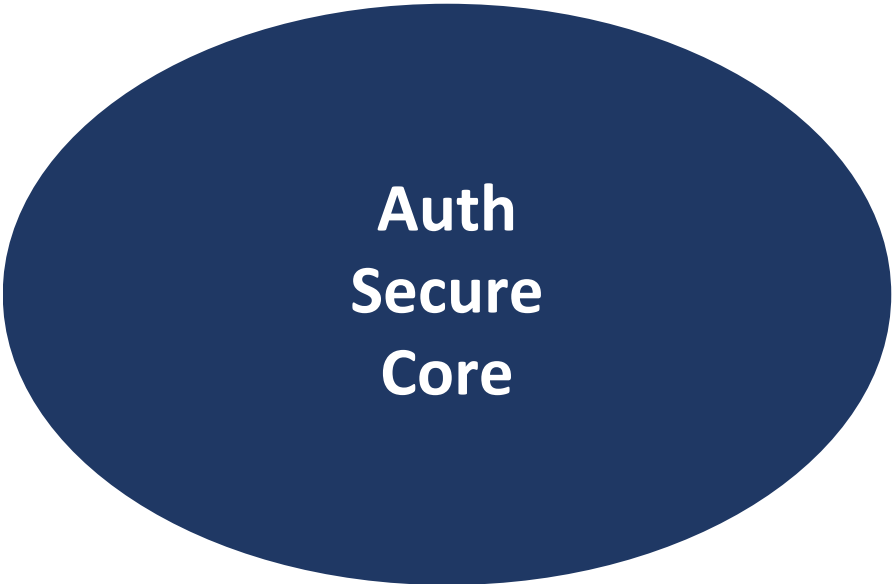

Conclusion



Plateforme centralisée répondant aux besoins réels de l'ENICarthage



Innovation par l'IA pour la détection précoce du décrochage



Sécurité & confidentialité au cœur de la conception



Déploiement ciblé en 26 semaines pour un budget de $\approx 44\,583$ TND



Engagement de toutes les parties prenantes pour garantir l'adoption

"Prendre soin des étudiants aujourd'hui, c'est construire les professionnels épanouis de demain."
